TA. 2025

LAPORAN PROGRES PELAKSANAAN PEKERJAAN

NAMA PAKET :

REHABILITASI JEMBATAN 2 PULAU DOMPAK, KOTA TANJUNGPINANG

(LAPORAN MINGGUAN KE-21)

TANGGAL : 10 NOVEMBER – 16 NOVEMBER 2025



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

INFORMASI PROYEK

Nama Paket	: Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
Kontrak Awal	
- Nomor	: 3.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.16/VI/2025
- Tanggal	: 24 Juni 2025
- Nilai Kontrak	: Rp. 3.406.934.600,00 (Termasuk Ppn)
Waktu Pelaksanaan	: 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender
Tgl akhir kontrak	: 20 Desember 2025
Sumber Dana	: APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025
Kontraktor Pelaksana	: CV. INDRAGIRI PUTRA
Konsultan Pengawas	: CV. EXA ENGINEERING CONSULTANT
Jumlah Tiang Penanganan	: Sisi Dompak 5 Tiang dan Sisi Bintan 6 Tiang

PROGRES FISIK DAN TITIK KOORDINAT

PROGRES FISIK %		
Rencana	**Realisasi**	**Deviasi**
87,94%	100,00%	12,06%

Status : 10 November 2025 – 16 November 2025 (Minggu KE-21)

Waktu Pelaksanaan sampai dengan saat ini :
Jumlah hari terpakai sampai saat ini : 146 HK
Jumlah hari kontrak : 180 HK
Jumlah hari sisa kontrak : 34 HK

PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

- ✓ Divisi 1
  - ➢ Pembersihan Kantor
  - ➢ Pembuatan laporan

DOKUMENTASI PEKERJAAN MINGGU KE - 20






















MONITORING PEKERJAAN MINGGU KE-21

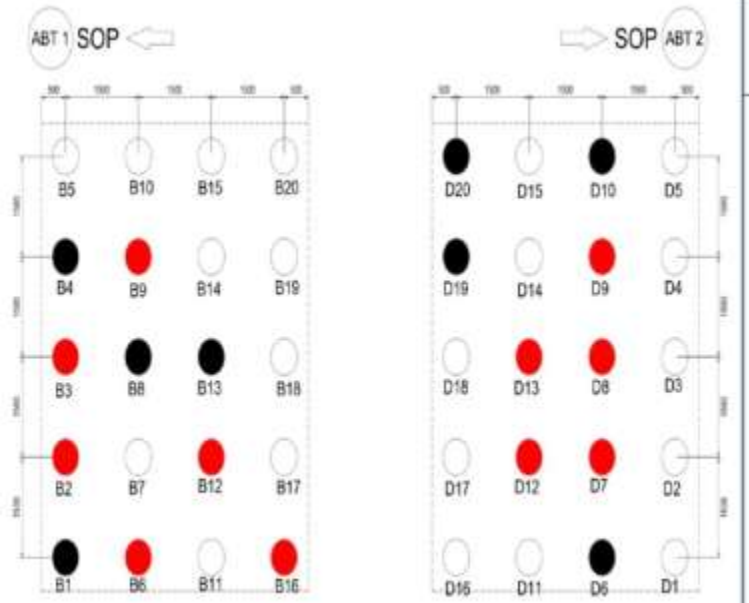



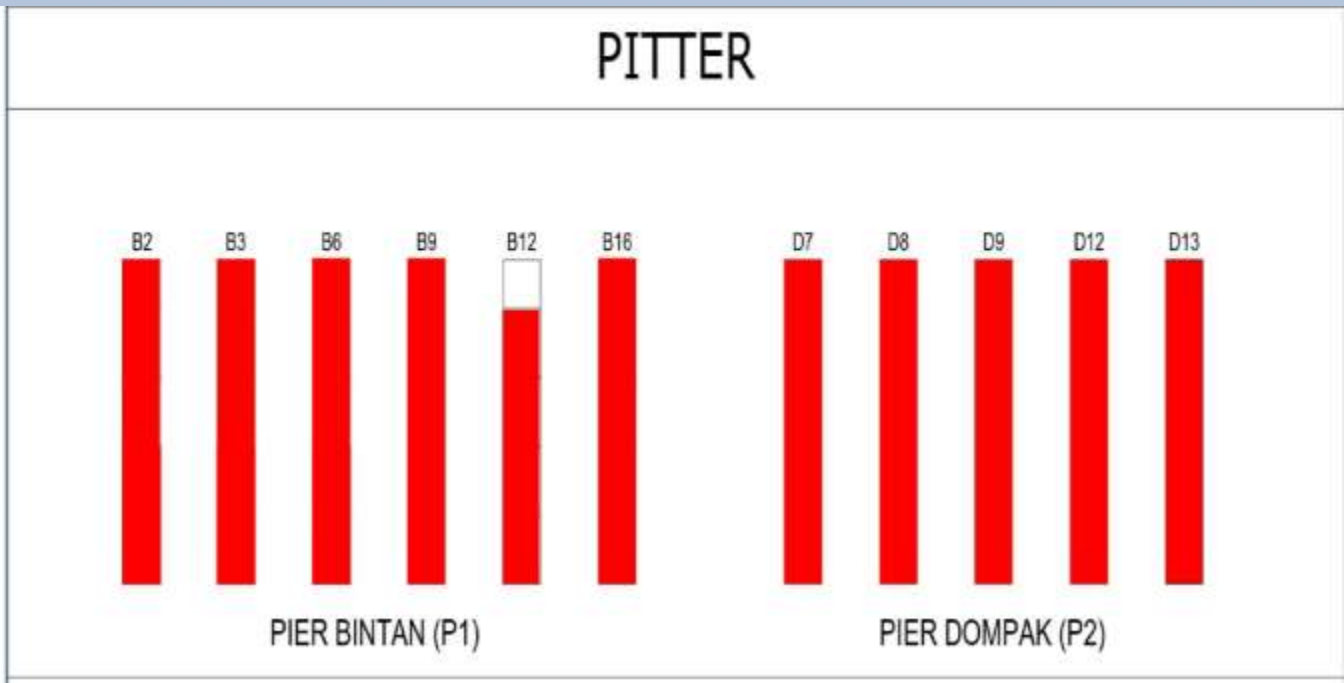

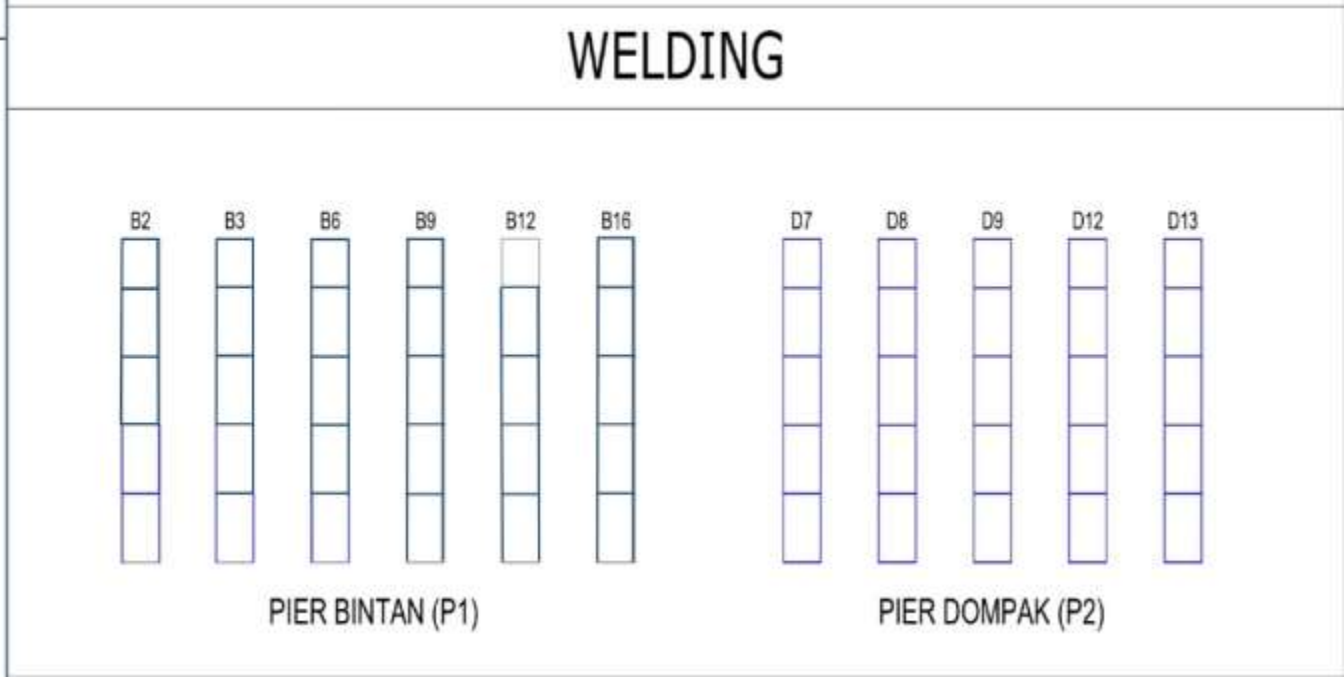

LAPORAN MINGGU KE-21

REHABILITASI JEMBATAN 2 PULAU DOMPAK, KOTA TANJUNGPINANG

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

CV. EXA ENGINEERING CONSULTANT

CV. INDRAGIRI PUTRA

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE - 21

PERIODE	:	10 November 2025 - 16 November 2025
PEMILIK PROYEK	:	PEMPROV DINAS PUPR
KONSULTAN SUPERVISI	:	CV. EXA ENGINEERING CONSULTANT
KONTRAKTOR PELAKSA	:	CV. INDRAGIRI PUTRA

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	KONTRAK MC 0					PROGRESS									KET
							S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT	VOLUME	HARGA	BOBOT	VOLUME	HARGA	BOBOT	VOLUME	HARGA	BOBOT	
	DIVISI 1. UMUM															
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	73.778.000,00	73.778.000,00	2,404%	0,868	64.058.000,00	2,09%	0,132	9.720.000,00	0,32%	1,000	73.778.000,00	2,40%	
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,332%	0,794	8.100.000,00	0,26%	0,206	2.100.000,00	0,07%	1,000	10.200.000,00	0,33%	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	23.642.595,52	23.642.595,52	0,770%	0,841	19.892.595,52	0,65%	0,159	3.750.000,00	0,12%	1,000	23.642.595,52	0,77%	
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,283%	0,667	5.800.000,00	0,19%	0,333	2.900.000,00	0,09%	1,000	8.700.000,00	0,28%	
	DIVISI 7. STRUKTUR															
SKh. 7.4.(6)	Pembersihan Tiang Pancang Diameter 456 mm	M'	131,00	788.907,56	103.346.890,36	3,367%	131,000	103.346.890,36	3,37%	-	-	-	131,00	103.346.890,36	3,37%	
7.4.(1b)	Penyediaan Baja Struktur Grade 345(Kuat Leleh 345	M'	127,70	4.011.454,56	512.262.747,31	16,690%	127,700	512.262.747,31	16,69%	-	-	-	127,700	512.262.747,31	16,69%	
SKh. 7.4.(5c)	Pemasangan Plat Doubling Dia. 500 mm, Tebal 12 mm	M'	290,60	5.266.453,37	1.530.431.349,32	49,862%	290,600	1.530.431.349,32	49,86%	-	-	-	290,600	1.530.431.349,32	49,86%	
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN															
SKh.8.10.(15)	Pekerjaan Petrolatum Primer + Tape	M'	127,70	1.746.413,89	223.017.053,75	7,266%	127,700	223.017.053,75	7,27%	-	-	-	127,700	223.017.053,75	7,27%	
SKh.8.7.(2d)	Blasting dan Painting Baja	M2	394,56	541.319,59	213.583.057,43	6,959%	394,562	213.584.330,61	6,96%	-	-	-	394,562	213.584.330,61	6,96%	
SKh.8.10.(17)	Penyediaan dan Pemasangan HDPE jacket ; L= 4 m	tik	11,00	19.871.473,01	218.586.203,11	7,122%	11,000	218.586.203,11	7,12%	-	-	-	11,00	218.586.203,11	7,12%	
1	**DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-**															
	Pengadaan dan Pemasangan Tiang Lampu Okta Gonal H9, dan Templates Lampu Solar Cell LED Power 85 watt	Buah	4,00	37.940.642,06	151.762.568,24	4,945%	4,000	151.762.568,24	4,94%	-	-	-	4,00	151.762.568,24	4,94%	-
	TOTAL				3.069.310.465,05	100,000%		3.050.841.738,23	99,40%		18.470.000,00	0,60%		3.069.311.738,23	100,00%	

PROGRES REALISASI	100,00%
PROGRES RENCANA	87,94%
DEVIASI +/-	12,06%

Disetujui Oleh :
DIREKSI TEKNIS
DINAS PUPR PROVINSI KEPRI

Rahmat Azwir Putra, A.Md
Nipppk. 19960328 202321 1 008

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. EXA ENGINEERING CONSULTANT

Edy Sulamo
Inspektor

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. INDRAGIRI PUTRA

Budianto, ST
Pelaksana Lapangan

TIME SCHEDULE KE-21

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Idaman Kota Piring"
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Lantai-I)
Pulau Dompak Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telp. (0771) 4575822, Fax. (0771) 4575168

PEKERJAAN : REHABILITASI JEMBATAN 2 PULAU DOMPAK KOTA TANJUNGPINANG
SUMBER DANA : APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020
NILAI KONTRAK : Rp. 3.409.934.909,00

SCHEDULE PELAKSANAAN

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Jml	Harga Satuan	Jumlah Harga	BOBOT	Juni M1 24 - 29	Juli M2 30 - 06	Juli M3 07 - 13	Juli M4 14 - 20	Juli M5 21 - 27	Juli M6 28 - 31	Agustus M6 01 - 03	Agustus M7 04 - 10	Agustus M8 11 - 17	Agustus M9 18 - 24	Agustus M10 25 - 31	September M11 01 - 07	September M12 08 - 14	September M13 15 - 21	September M14 22 - 28	September M15 29 - 30	Oktober M15 01 - 05	Oktober M16 06 - 12	Oktober M17 13 - 19	Oktober M18 20 - 26	Oktober M19 27 - 31	November M20 03 - 09	November M21 10 - 16	November M22 17 - 23	November M23 24 - 30	Desember M24 01 - 07	Desember M25 08 - 14	Desember M26 15 - 21
	DIVISI 1. UMUM																																	
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	73.778.000,00	73.778.000,00	2,43%	0,23%	0,20%	0,07%	0,01%	0,00%	0,11%	0,09%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													0,07%
							0,03%	0,01%	0,07%	0,04%	0,00%	0,02%	0,01%		1,40%			0,01%										0,26%	0,32%					
1.6(1)	Manajemen dan Keselamatan LaLin	LS	1,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,33%				0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
															0,04%			0,05%	0,06%		0,02%			0,03%				0,05%	0,07%					
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	23.642.999,52	23.642.999,52	0,77%				0,04%	0,03%	0,02%	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
										0,15%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%			0,04%	0,03%		0,13%			0,08%				0,13%	0,12%					
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,23%					0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
																		0,05%	0,04%		0,04%			0,03%					0,02%					
	DIVISI 7. STRUKTUR																																	
9(b). 7.4.(8)	Pembersihan Tiang Pancang Diameter 406 mm	M'	133,00	788.907,96	103.348.860,36	3,37%									0,11%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,26%	0,27%	0,11%	0,23%	0,27%	0,27%	0,11%	0,04%	0,11%	0,11%					
																1,33%	0,67%					0,32%	0,17%	0,19%	0,19%	0,02%		0,08%					
9(b). 7.4.(15)	Pengadaan Pile Doubling Dia. 500 mm, Tebal 12 mm	M'	127,70	4.911.456,56	912.282.747,31	16,99%								0,00%	0,00%	1,80%	1,80%	1,65%	1,80%	1,82%	1,83%	0,00%	1,33%	1,83%	1,83%	0,02%		0,24%					
																4,57%	0,24%	7,26%	1,15%	0,57%	0,57%			0,23%	0,23%	0,02%	0,01%	0,24%					
9(b). 7.4.(16)	Pemasangan Pile Doubling Dia. 500 mm, Tebal 12 mm (Under Water)	M'	260,60	5.268.453,37	1.530.431.349,32	49,99%												4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	1,99%	2,91%	4,16%	4,16%	4,16%	2,91%	4,16%	4,16%	4,16%				
																	1,25%	0,84%	7,17%	11,08%	2,25%			2,51%	0,68%	0,02%	0,22%	4,00%					
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN																																	
9(b).8.10.(15)	Pekerjaan Pemotokan Pomer + Tapa	M'	127,70	1.746.613,66	223.017.653,75	7,27%										0,33%	0,33%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,24%	0,66%	0,66%	0,66%	0,47%	0,66%	0,33%					
																	0,58%	0,14%	1,47%	0,32%	0,24%			0,42%	1,34%	0,46%	0,01%	0,24%					
9(b).8.7.(20)	Sloping dan Paming Baja	M2	394,66	541.319,59	213.583.057,43	6,96%						0,33%	0,26%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%													
															2,10%	0,67%	4,21%																	
9(b).8.10.(17)	Penyediaan dan Pemasangan HDPE jacket ; L= 4 m	Bh	11,00	19.871.473,01	218.586.203,11	7,12%																				1,10%	0,85%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%			
																					3,24%						1,94%	1,94%						
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAN LAIN-LAIN																																	
	Pengadaan dan Pemasangan Tiang Lampu Okta Gonal H9, galvanis angkur bolt Tempatan lampu solar Cell 80 watt	Bh	4,0	37.940.642,06	151.762.568,24	4,94%																								0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%
																											4,94%						
					3.069.310.465,93	100,00%																													
	RENCANA						0,26%	0,20%	0,67%	0,11%	0,10%	0,49%	0,38%	1,62%	1,75%	3,15%	3,73%	6,22%	6,22%	6,25%	7,35%	1,94%	4,84%	7,19%	5,18%	6,37%	4,42%	6,37%	6,04%	6,39%	2,24%	1,05%	1,05%	1,33%
	RENCANA KUMULATIF						0,26%	0,46%	0,47%	0,58%	0,71%	1,19%	1,56%	3,18%	4,93%	8,09%	11,82%	20,04%	26,26%	36,51%	43,82%	45,85%	50,69%	57,79%	62,97%	69,34%	73,79%	81,16%	87,34%	94,33%	96,57%	97,62%	98,67%	100,00%
	RENCANA BULANAN						0,26%			0,98%					10,83%					34,03%					27,61%				22,81%				3,43%	
	RENCANA BULANAN KUMULATIF						0,26%			1,19%					11,82%					45,85%					73,79%				96,57%				100,00%	
	REALISASI						0,02%	0,01%	0,07%	0,16%	0,11%	0,33%	0,02%	0,01%	3,83%	6,18%	7,01%	8,43%	10,11%	13,26%	8,15%	0,32%	0,13%	3,85%	9,54%	5,62%	11,85%	12,06%	0,60%					
	REALISASI KOMULATIF						0,02%	0,04%	0,10%	0,26%	0,40%	0,44%	0,46%	0,47%	4,11%	10,29%	17,29%	25,71%	35,82%	49,07%	57,22%	57,54%	57,67%	61,52%	71,06%	76,68%	88,53%	100,00%						
	DEVIASI						-0,18%	-0,36%	-0,36%	-0,29%	-0,30%	-0,75%	-1,09%	-1,71%	-0,82%	2,20%	5,44%	0,67%	7,36%	12,46%	11,21%	9,69%	4,99%	1,83%	6,19%	0,65%	13,14%	17,46%	12,06%					

Diketahui Oleh:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PUPR PROVINSI KEPRI

Devi Saputra, ST
Nip. 19800626 201001 1 006

Diperiksa Oleh:
KONSULTAN SUPERVISI
CV. EXA ENGINEERING CONSULTANT

Eka Kurniawan , ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. INDRAGIRI PUTRA

Sukarto, ST
Pelaksana Lapangan
