
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN MINGGU 15

INSTANSI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENAATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
SUB KEGIATAN	:	REKONSTRUKSI JALAN
PEKERJAAN	:	REKONSTRUKSI JL. PELANTAR II, KOTA TANJUNGPINANG
LOKASI	:	KOTA TANJUNGPINANG
SUMBER DANA	:	APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025
KONTRAKTOR PELAKASANA	:	PT. BENGKEL KREATIF UTAMA
KONSULTAN SUPERVISI	:	CV. GLOBAL KREATIF KONSULTAN
NOMOR KONTRAK	:	12.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/IX/2025
TANGGAL KONTRAK	:	3 SEPTEMBER 2025
NOMOR KONTRAK ADD - I	:	ADD-01.12.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/IX/2025
TANGGAL KONTRAK ADD - I	:	17 OKTOBER 2025
WAKTU PELAKSANAAN KONTRAK	:	105 (SERATUS LIMA) HARI KALENDER
WAKTU PEMELIHARAAN	:	365 (TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA) HARI KALENDER

No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT ADD (%)	MASA PELAKSANAAN 105 HARI KALENDER															MASA PEMELIHARAAN	BOBOT (%)
			3-Sep 9-Sep MG 1	10-Sep 16-Sep MG 2	17-Sep 23-Sep MG 3	24-Sep 30-Sep MG 4	1-Oct 7-Oct MG 5	8-Oct 14-Oct MG 6	15-Oct 16-Oct MG 7	17-Oct 21-Oct MG 7a	22-Oct 28-Oct MG 8	29-Oct 4-Nov MG 9	5-Nov 11-Nov MG 10	12-Nov 18-Nov MG 11	19-Nov 25-Nov MG 12	26-Nov 2-Dec MG 13	3-Dec 9-Dec MG 14	10-Dec 16-Dec MG 15		
	DIVISI 1. UMUM																		
1.2	**Mobilisasi**																		
1.2	Mobilisasi	0.778		0.088	0.088	0.088	0.088	0.088	0.088	0.044	0.044	0.088						0.071	
1.8	**Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas**																		
1.8.(2)	Jembatan Sementara	1.850		0.841	0.841					0.168									
1.17	**Pengamanan Lingkungan Hidup**																		
1.17.(2d)	Dokumen UKL-UPL	2.775	0.005	0.505	0.505	0.505	1.005				0.126	0.126							
1.17.(2e)	Andalalin	1.542									0.771	0.771							
1.18	**Relokasi Utilitas dan Pelayanan yang Ada**																		
1.18.(1)	Relokasi Tiang Listrik TR	1.110	0.036	0.336													0.336	0.401	
1.20	**Pengujian Tanah**																		
1.20.(1)	Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan	2.960	0.897	0.897	0.897					0.269									
1.21	**Manajemen Mutu**																		
1.21	Manajemen Mutu	0.032	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
	SKh-1.22. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)																		
1	**Penyiapan dokumen penerapan SMKK:**																		
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK	0.039	0.035							0.004									
2	**Sosialisasi, promosi dan pelatihan:**																		
SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk	0.005	0.004							0.000									
SKh-1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	0.008	0.007							0.001									
3	**Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:**																		
3b	**APD, antara lain :**																		
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	0.037	0.034							0.003									
SKh-1.1.22.(3b6)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0.007	0.006							0.001									
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	0.006	0.006							0.001									
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	0.111	0.101							0.010									
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	0.049	0.045							0.004									
4	**Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi:**																		
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi(Construction All Risk/ CAR)	0.170	0.154							0.015									
5	**Personel Keselamatan Konstruksi:**																		
SKh-1.1.22.(5a)	Ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi(sebagai pimpinan UKK/personil manajerial)	2.752	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	
6	**Fasilitas sarana, Prasarana, dan alat kesehatan**																		
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	0.022	0.020							0.002									
7	**Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:**																		
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	0.011	0.010							0.001									
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	0.022	0.020							0.002									
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	0.007	0.007							0.001									
9	**Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian RisikoKeselamatan Konstruksi:**																		
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	0.015	0.014							0.001									
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	0.003	0.003							0.000									
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0.008	0.007							0.001									
SKh-1.1.22.(9b)	Pengujian Baku Mutu Air Lengkap	0.093	0.042			0.042				0.008									
SKh-1.1.22.(9c)	Pengujian Baku Mutu Udara Ambien Lengkap	0.123	0.056			0.056				0.011									
SKh-1.1.22.(9d1)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	0.062	0.028					0.028		0.006									
SKh-1.1.22.(9d2)	Pengujian Tingkat Getaran Kendaraan Bermotor	0.062	0.028					0.028		0.006									
	DIVISI 7. STRUKTUR																		
7.1 (5a)(1)	Beton struktur, fc'30 Mpa (Ready Mixed)	7.665									0.958	0.958	0.958	0.958	0.958	0.958	0.958	0.958	
7.3 (4)	Baja Tulangan Sirip BjTS 420B	10.098				1.102	1.102	1.102	1.102	0.711	0.711	0.711	0.711	0.711	0.711	0.711	0.711		
7.6.(8d)	Penyediaan Casing Pipa Baja Diameter 600 mm tebal 6 mm	25.006	0.810	0.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389				
7.6.(14c) 1	Pemasangan Cashing Baja Diameter 600 mm Tipe 1	3.351		0.329	0.329	0.329	0.329	0.329	0.329	0.230	0.230	0.230	0.230	0.230	0.230				
7.6.(19a) 1	Tiang Bor Beton, diameter 600 mm Tipe 1	6.405								1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067				
7.6.(19a) 2	Tiang Bor Beton, diameter 600 mm Tipe 2	30.901		0.544	1.544	3.544	3.544	4.844	4.044	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140				
7.6 (28)	Pengujian Keutuhan Tiang dengan Pile Integrated Test (PIT)	0.266							0.403										
7.6 (28a)	Pengujian PDA	0.486							0.736										
7.11.(6A)	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Baja Siku L 150x150x10 mm	0.267													0.133		0.133		
7.14.(2)	Pembongkaran Beton	0.855		0.196	0.196	0.196	0.196	0.196	0.196										
7.16.(3b)	Pipa Drainase PVC diameter 75 mm	0.041										0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	
	RENCANA FISIK	100.00	2.444	4.615	6.279	7.741	8.142	8.494	8.777	6.646	8.692	8.742	7.757	7.757	7.890	1.931	2.401	1.691	
	RENCANA FISIK KUMULATIF		2.444	7.059	13.338	21.079	29.222	37.715	46.493	53.139	61.831	70.573	78.329	86.086	93.976	95.908	98.309	100.00	
	REALISASI FISIK		6.252	3.758	7.123	14.544	11.044	10.900	7.434	5.441	8.133	3.318	4.046	3.576	10.046	0.327	0.229	3.829	
	REALISASI FISIK KUMULATIF		6.252	10.010	17.133	31.677	42.721	53.622	61.055	66.496	74.629	77.947	81.993	85.569	95.615	95.942	96.171	100.00	
	DEVIASI		3.808	2.950	3.794	10.598	13.500	15.906	14.563	13.358	12.798	7.374	3.663	(0.518)	1.639	0.034	(2.138)	-	

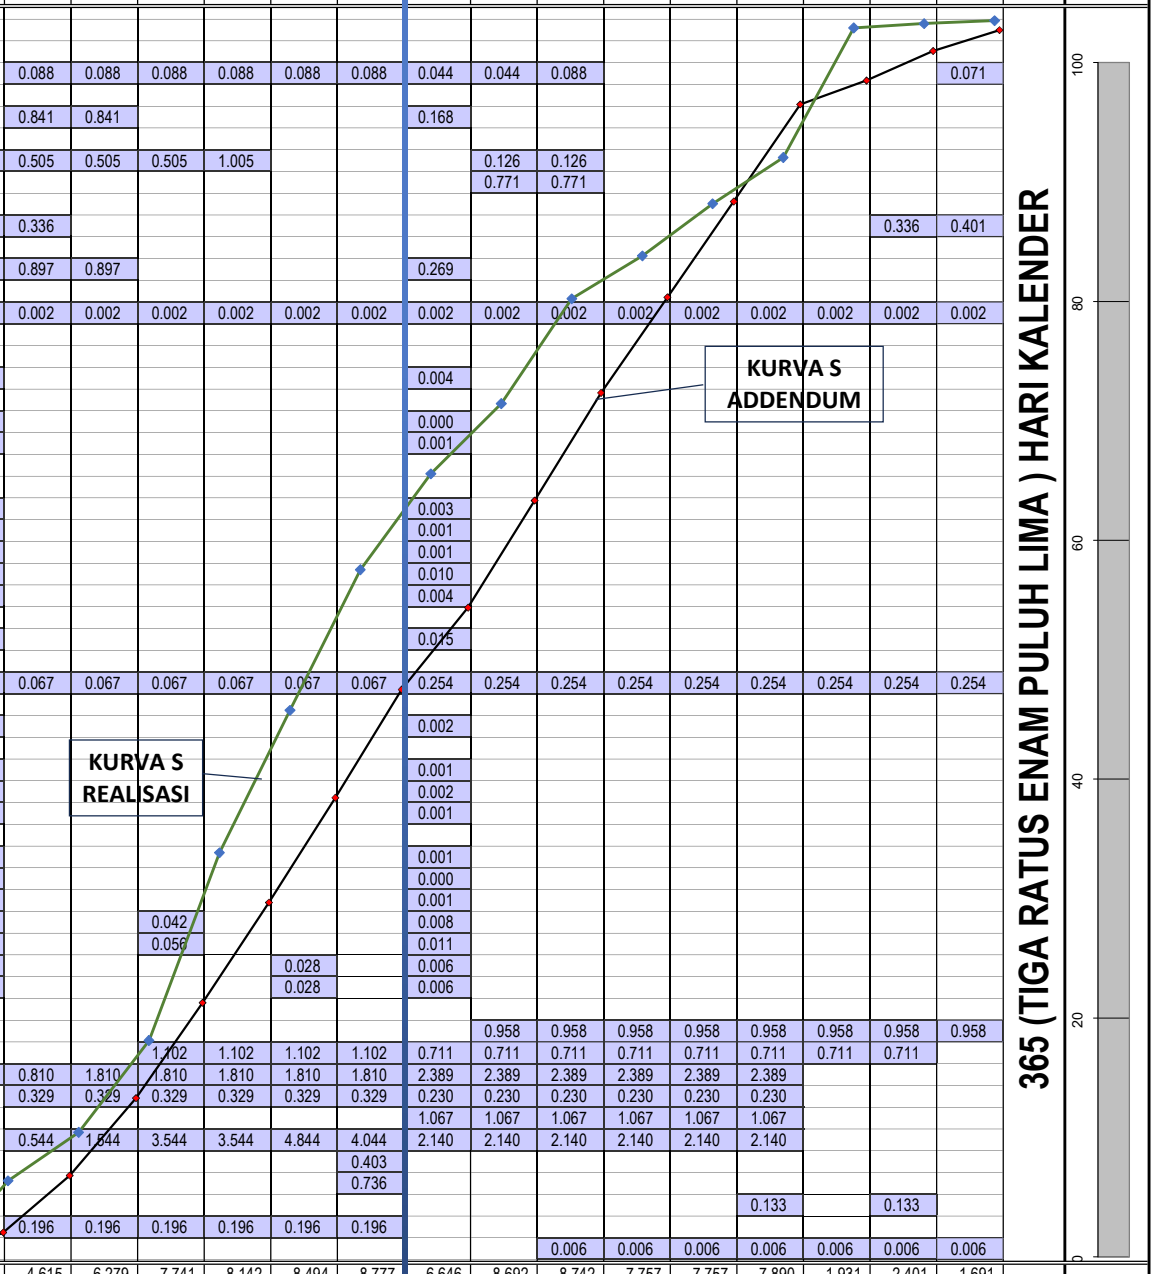

Mengetahui :	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	**CV. GLOBAL KREATIF KONSULTAN**	**PT. BENGKEL KREATIF UTAMA**
REKONSTRUKSI JL. PELANTAR II, KOTA TANJUNGPINANG		
DANIEL S, S.T, M.T	**Ir. ILHAM, M.T**	**WEWEL ADISA**
19780719 201001 1 009	Supervisi Engineer	Direktur
