
JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN (120 HARI KALENDER)

Nama Paket Rekonstruksi Jalan Toapaya - Tembeling, Kabupaten Bintan
Prop / Kab / Kodya Kepulauan Riau / Kabupaten Bintan
Masa Pelaksanaan 120 Hari Kalender

ITEM MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL. ADD 01	BOBOT PEKERJAAN ADD 01 (%)		MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN 120 HARI KALENDER																	BOBOT
						Minggu Ke - 1	Minggu Ke - 2	Minggu Ke - 3	Minggu Ke - 4	Minggu Ke - 5	Minggu Ke - 6	Minggu Ke - 7	Minggu Ke - 8	Minggu Ke - 9	Minggu Ke - 10	Minggu Ke - 11	Minggu Ke - 12	Minggu Ke - 13	Minggu Ke - 14	Minggu Ke - 15	Minggu Ke - 16	Minggu Ke - 17	Minggu Ke - 18	%
						3-8	9-15	16-22	23-01	2-8	9-15	16-22	23-29	30-5	6-12	13-19	20-26	27-3	4-10	11-17	18-24	25-31	1-2	
	DIVISI 1. UMUM																						
1.2	***Mobilisasi***																						
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	0,113	Renc	0,041	0,041																0,035
					Real				0,085													0,028	
1,22	**SKh-1.22. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)**																						
1	**Penylapan dokumen penerapan SMKK:**																						
1a	Pembuatan dokumen SMKK yang terdiri dari dokumen RKK dan RMPK	Set	3,00	0,014	Renc	0,007	0,007																
					Real	0,014																	
1e	Penyusunan Pelaporan Penerapan SMKK	Set	3,00	0,011	Renc	0,005	0,005																
					Real	0,011																	
2	**Sosialisasi, promosi dan pelatihan:**																						
2u	Papan Nama Proyek	Lembar	1,00	0,028	Renc	0,028																	
					Real			0,028															
3	**Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:**																						
3t	Sepatu Keselamatan (Rubber shoes/ boots sesuai SNI:2017)	Pasang	25,00	0,150	Renc	0,075	0,075																
					Real		0,150																
3u	Sepatu Keselamatan (Safety shoes dengan pelindung pada pergelangan kaki dan ujung yang keras di bagian jari kaki dengan standar SNI 7079:2009)	Pasang	25,00	0,118	Renc	0,059	0,059																
					Real		0,118																
3y	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	25,00	0,015	Renc	0,007	0,007																
					Real		0,015																
4	**Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi:**																						
4a	Asuransi(Construction All Risk/ CAR)	Ls	1,00	0,133	Renc	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
					Real			0,133															
5	**Personel Keselamatan Konstruksi:**																						
5c	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Org	1,00	0,446	Renc	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
					Real		0,446																
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																						
3.1.(10b)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	197,78	1,453	Renc					0,458	0,458	0,458	0,458										
					Real					0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,042							
3.1.(11)	Galian Perkerasan berbutir	M3	988,83	1,036	Renc					0,218	0,218	0,218	0,218										
					Real					0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,030							
3.2.(2a1)	Timbunan Pilihan Halus dari sumber galian	M3	178,70	1,111	Renc															1,399			
					Real															1,111			
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN																						
5.3.(1a2)	Perkerasan Beton Semen Fs' 3.8 Mpa	M3	791,07	55,003	Renc						6,427	6,427	6,427	6,427	6,427	6,427	6,427	6,427	6,427				
					Real					8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	1,604							
5.3.(5)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	M3	395,58	16,186	Renc					2,431	2,431	2,431	2,431	2,431	2,431	2,431							
					Real					2,619	2,619	2,619	2,619	2,619	2,619	0,474							
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																						
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	801,98	0,553	Renc															0,218	0,218		
					Real														0,553				
6.3(4a1)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (tumbukan 50 x 2)	Ton	360,06	21,751	Renc															8,726	8,726		
					Real														21,751				
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN																						
9.2.(1c)	Marka Jalan Termoplastik Non Glow in The Dark (Penerapan Umum)	M2	190,56	1,880	Renc																2,109		
					Real																1,880		
				JUMLAH	100,00																		
	BOBOT RENCANA KEMAJUAN FISIK / MINGGU	%				0,256	0,229	0,034	0,034	3,142	9,569	9,569	9,569	8,893	8,893	8,893	6,461	6,461	6,461	10,378	11,088	0,034	0,035
	RENCANA KUMULATIF KEMAJUAN FISIK / MINGGU	%				0,256	0,485	0,519	0,553	3,695	13,264	22,834	32,403	41,296	50,189	59,081	65,543	72,004	78,466	88,843	99,931	99,965	100,000
	REALISASI KEMAJUAN FISIK / MINGGU	%				0,024	0,729	0,161	0,085	11,921	11,921	11,921	11,921	11,921	11,921	2,151	-	-	22,384	1,111	1,880	0,028	-
	REALISASI KUMULATIF KEMAJUAN FISIK / MINGGU	%				0,024	0,753	0,914	0,999	12,920	24,841	36,762	48,684	60,605	72,526	74,677	74,677	74,677	96,980	98,092	99,972	100,000	100,000
	DEVIASI	%				(0,232)	0,268	0,395	0,445	9,225	11,577	13,929	16,281	19,309	22,338	15,595	9,134	2,673	18,515	9,248	0,041	0,035	-

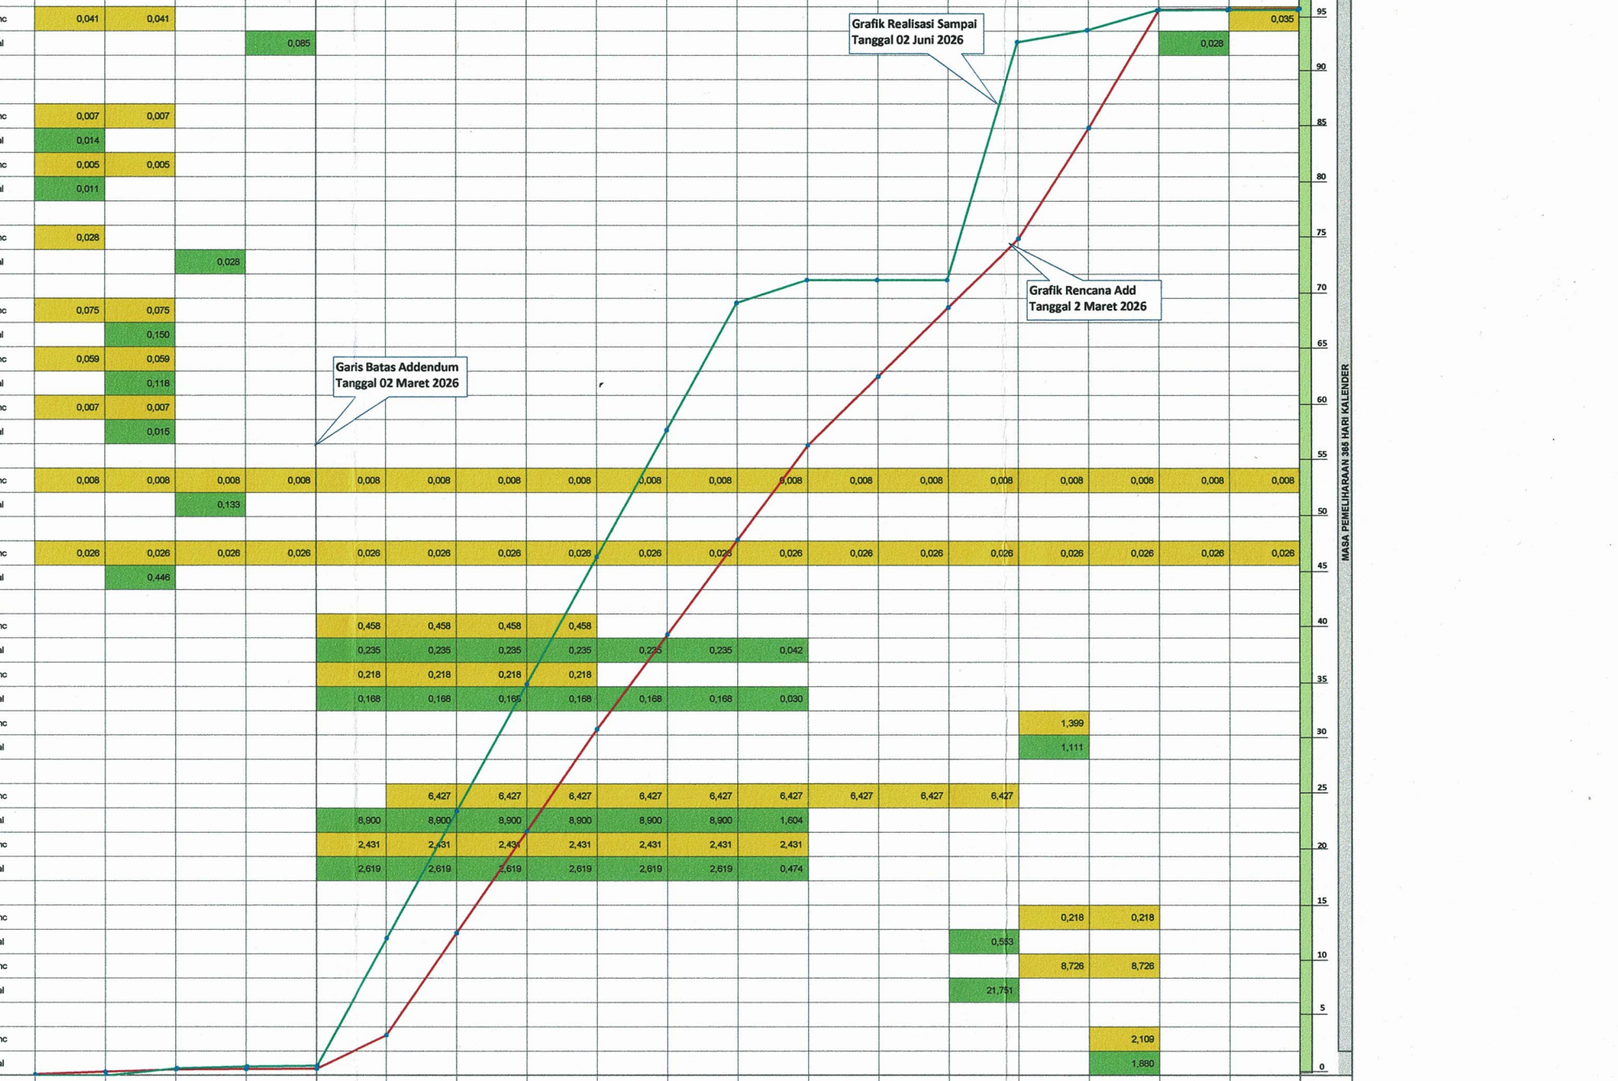

CATATAN : 1 MINGGU ADALAH 7 (TUJUH) HARI KALENDER KERJA, KHUSUS MINGGU KE 18 ADALAH 2 HARI KALENDER KERJA

DISETUJUI OLEH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RONNY SETIAWAN, S.T., M.M
NIP : 198205162006031001

DIPERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTANT

ZULFIKAR MUNIR PUTRA AUDYA, S.T
Supervisi Engineer

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. PRIYUDI AGUNG

CANDRA SEDYA PUTRA, S.T.
Manajer Proyek
